

格林纳达国家旅游度假区项目

工程进度展示

(临建设施建造)

2020

- 1 临建地基完成
- 2 临建外部结构完成
- 3 临建内部装修进行中

目录

PART 01

临建地基完成

格林纳达国家旅游度假区项目是一个世界级的度假区开发项目，项目位于格林纳达最北部的莱维纳地区，占地近3000亩。

2019年5月18日，恒升集团与格林纳达政府正式签署了格林纳达国家旅游度假区项目合作协议。



2020年5月，承建公司正式入驻格林纳达。项目伊始，临建区还是一片了无人烟的草地 。



2020年5月23日，设备和材料进场，建设工作有条不紊的展开了。



推土机进场



临建围挡
材料进场



挖机场平施
工



挖机和推
土机进行
场平工作



场平工作进行中.....



临建地基完成

2020年5月29日
临建场平完成。



地基建
造中.....



2020年7月16日，临建区地基建设完成。



PART 02

临建外部结构完成



搭建活动板房



2020年7月27日
活动板房入场

临建外部结构完成



加班加点

搭建围墙



临建外部结构完成



2020年8月6日
围墙搭建完成



2020年9月2日
板房搭建完成



搭建工人卫生间



临建外部结构完成

2020年9月22日，临建外部结构基本完成。



临建外部结构完成

2020年10月15日，临建
外部结构完成。



PART 03

临建内部装修进行中

临建内部装修进行中



内部装修中.....



内墙和地砖完成



卫生设施到位

家电和办公用品就位。



中铁建办公室



各功能区划分:

会议室





临建内部装修进行中



临建内部装修进行中

员工宿舍




工人宿舍



卫浴区 (2淋浴、2马桶、2洗手盆、2洗衣机、1热水器)



工人浴室及厕所

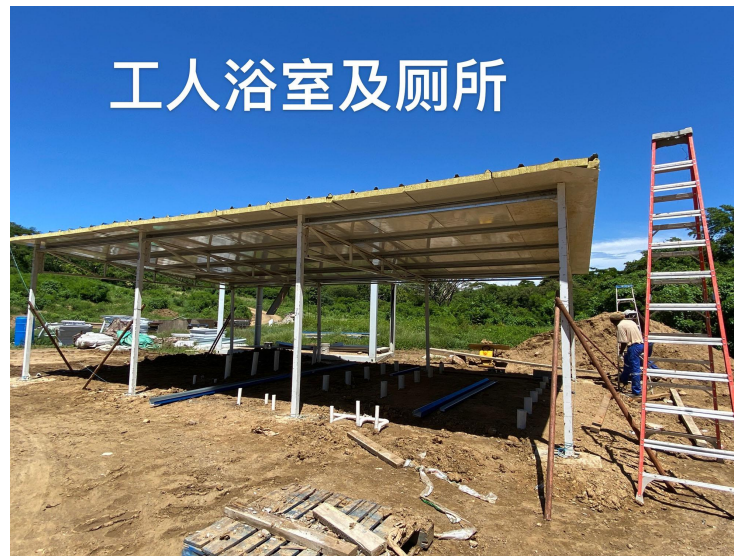

更多精彩
敬请期待！

